Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премиум "
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Абсолют"
Стройка - МКД по ул Некрасова,55, г.Хабаровск
Объект - МКД по ул.Некрасова,55, г.Хабаровск

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	25.08.2016	01.08.2016	31.08.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2016 г.

Смета №, Ремонт кровли кв.139 МКД по ул.Некрасова,55, г.Хабаровск
Основание - дефектная ведомость
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 69,670 тыс. руб.
Средства на оплату труда 13,320 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 69,47 чел.час

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	ТЕР13-06-004-01 *Постановл Губернат. Хабар края от 09.10 10 N119*	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	102	1,44	1,13	0,31		147	115	32		0,1 10,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР12-01-007-11 *И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС*	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой *2 277,36 = 14 931,25 · 0,71 х 100,17 · 0,06 х 130,57 · 0,12 х 105,32 · 0,00134 х 8 390,83 · 0,137 х 19 625,97 · 164 х 60,12*	100 м2 кровли	1,02 *102 / 100*	2277,36	602,16	21,34		2323	614	22		52 53,04	0,79 0,81
3	3	прайс	Унифлекс	м2	125	137				17125					
4	4	ТЕРм40-01-002-22 *Постановл Губернат Хабар.края от 09 10 10 N119*	Вертикальное перемещение на высоту до 20 м *266,44 = 340,91 · 0,59 х 117,19 · 5,33 х 1,00*	10 т	0,1 *1/10*	266,44	266,44			27	27			24,2 2,42	0,59 0,06
5	5	ТЕРм40-01-001-01 *Постановл Губернат Хабар края от 09 10 10 N119*	Горизонтальное перемещение *69,83 = 107,03 · 0,15 х 219,80 · 0,15 х 16,85 · 1,4 х 1,00*	10 т	0,1 *1/10*	69,83	69,83			7	7			6,76 0,68	0,3 0,03
6	6	ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1	52,73	52,73			53	53				
7	7	ТССЦпг03-02-01-010 *Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза	1 т груза	1	26,54		26,54		27		27			
8	8	ТЕРр58-7-1 *И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС*	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя *4 314,74 = 5 215,19 · 115 х 7,82*	100 м2 покрытия	0,14 *14 / 100*	4314,74	258,81	41,55	2,2	604	36	6		22,35 3,13	0,15 0,02
9	9	прайс	Унифлекс	м2	16	137				2192					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										40796	13320	552		69,47	0,92
Накладные расходы										10520					
Сметная прибыль										5455					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итоги по акту:															
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										37454				69,47	0,92
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										19317					
Итого										56771				69,47	0,92
В том числе:															
Материалы										26924					
Машины и механизмы										552					
ФОТ										13320					
Накладные расходы										10520					
Сметная прибыль										5455					
Составление сметной документации 4%										2271					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										59042					
НДС 18%										10628					
ВСЕГО по акту										69670				69,47	0,92

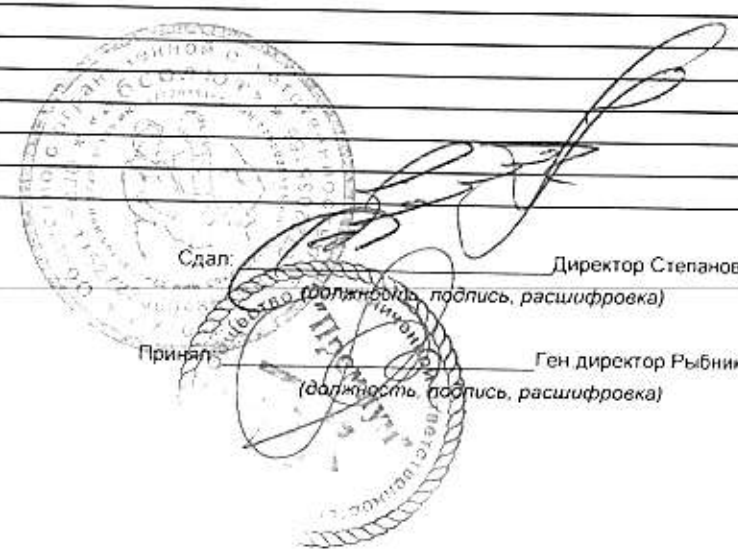

Сдал: _____ Директор Степанов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____ Ген директор Рыбникова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)
